

白井清掃センター解体工事

工事中間報告会

平成20年5月17日



安藤建設株式会社



3月11日からの工事の進捗状況としては、現在、建屋内の機器の洗浄(除染)がほぼ終了したところで、事故もなく、工程も順調に推移しております。

除染の効果の確認のため、サンプリング測定を行ないましたが、結果は基準値以下で、問題ないものでした。

来週から建屋内部での機器解体作業及びENTOS解体工法による煙突の除染・解体を開始する予定です。

	19年	平成20年										
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
調査・準備工												
仮設工												
ダイオキシン対策工												
ダイオキシン除去工												
解体工												
廃棄物処分												
環境調査												
片付け工												

除染後環境調査報告(ダイオキシン類)

ダイオキシン類除染後調査結果(H20.3.31サンプリング)

番号	設備名	分析対象物	測定値(pg-TEQ/m ³)	基準値
1	建屋集じん機	排出口大気	0.062	0.6

ダイオキシン類除染後調査結果(H20.4.14サンプリング)

番号	設備名	分析対象物	測定値(pg-TEQ/g)	基準値
2	排水処理設備	除染処理水	0.037	10


ダイオキシン類除染後調査結果(H20.4.25サンプリング)

番号	設備名	分析対象物	測定値(ng-TEQ/g)	基準値
3	焼却炉	除染後耐火レンガ	0	3.0
4	水噴射室	除染後耐火レンガ	1.3	3.0
5	空気予熱器	除染後耐火レンガ	0.033	3.0

建屋集じん機排出大気及び除染処理水ともに基準値を大きく下回りました。除染後の機器内部サンプリングについても基準値を下回っており、除染の効果が確認できました。
又、作業中の集じん機排出口での粉じん測定による管理でも異常は認められませんでした。

速報値

除染後サンプリング位置図

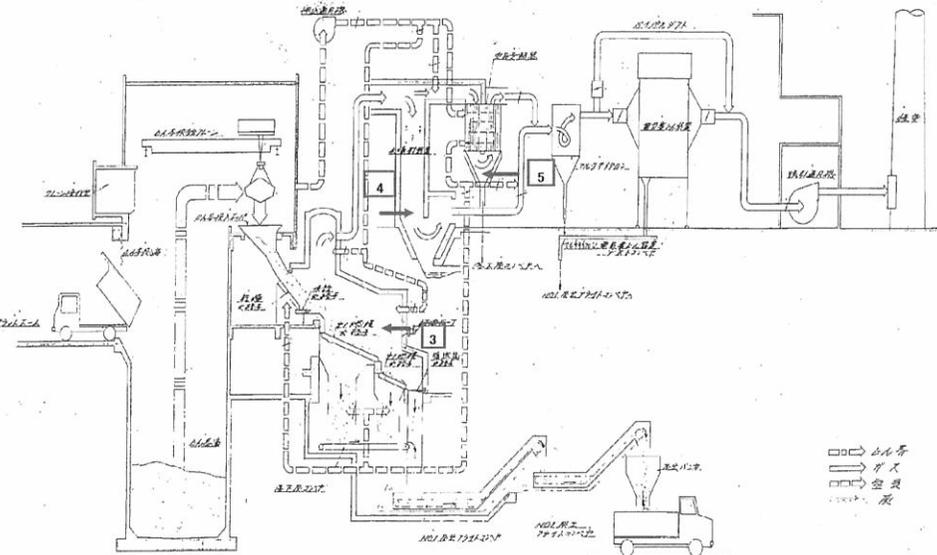

ダイキシン除染写真(焼却炉内部)

除染前



除染後



除染前




除染後




除染前(誘引送風機)




除染前(空気予熱器)

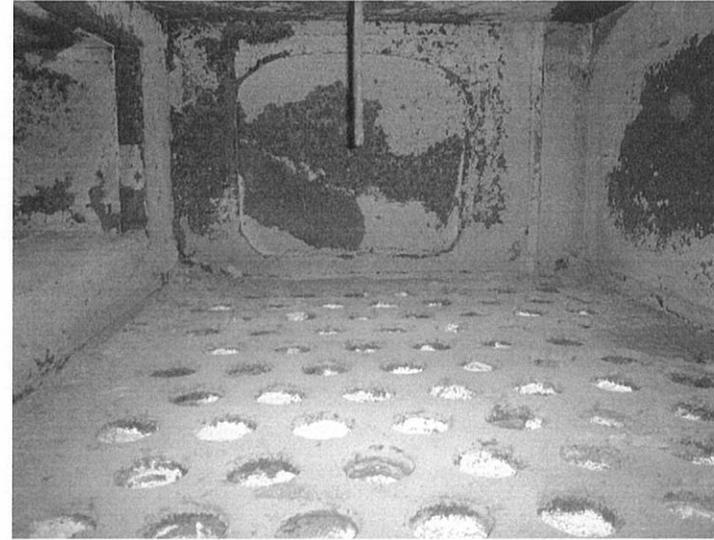

除染後(誘引送風機)

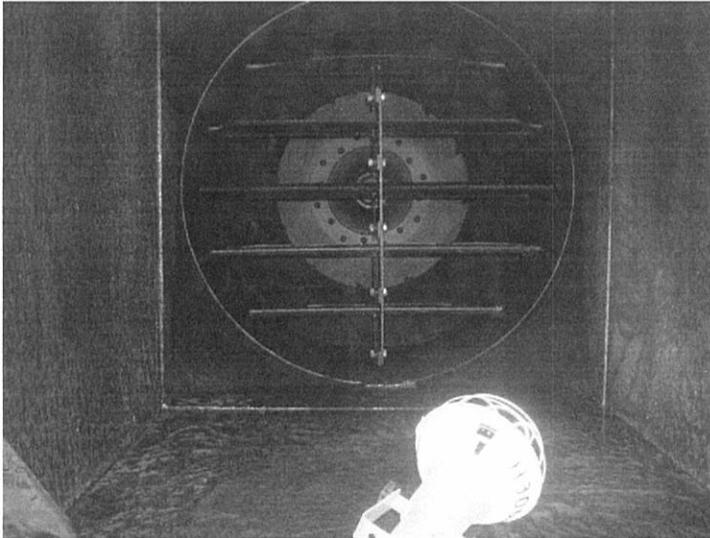

除染後(空気予熱器)

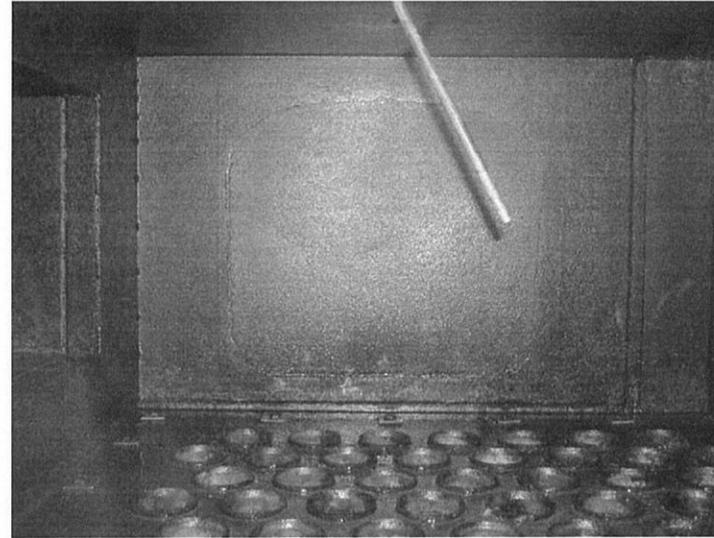

今までは調査・準備・ダイオキシン除染作業が主な作業で大型重機の使用も少ない為、比較的騒音・振動の影響も多くなかったのではと思われますが、来週から、建屋内機器解体作業及び煙突の除染・解体作業が始まります。

引き続き、騒音・振動の抑制及び安全には細心の注意を払って作業を行ってまいりますので、今後ともご協力よろしく御願い致します。
